
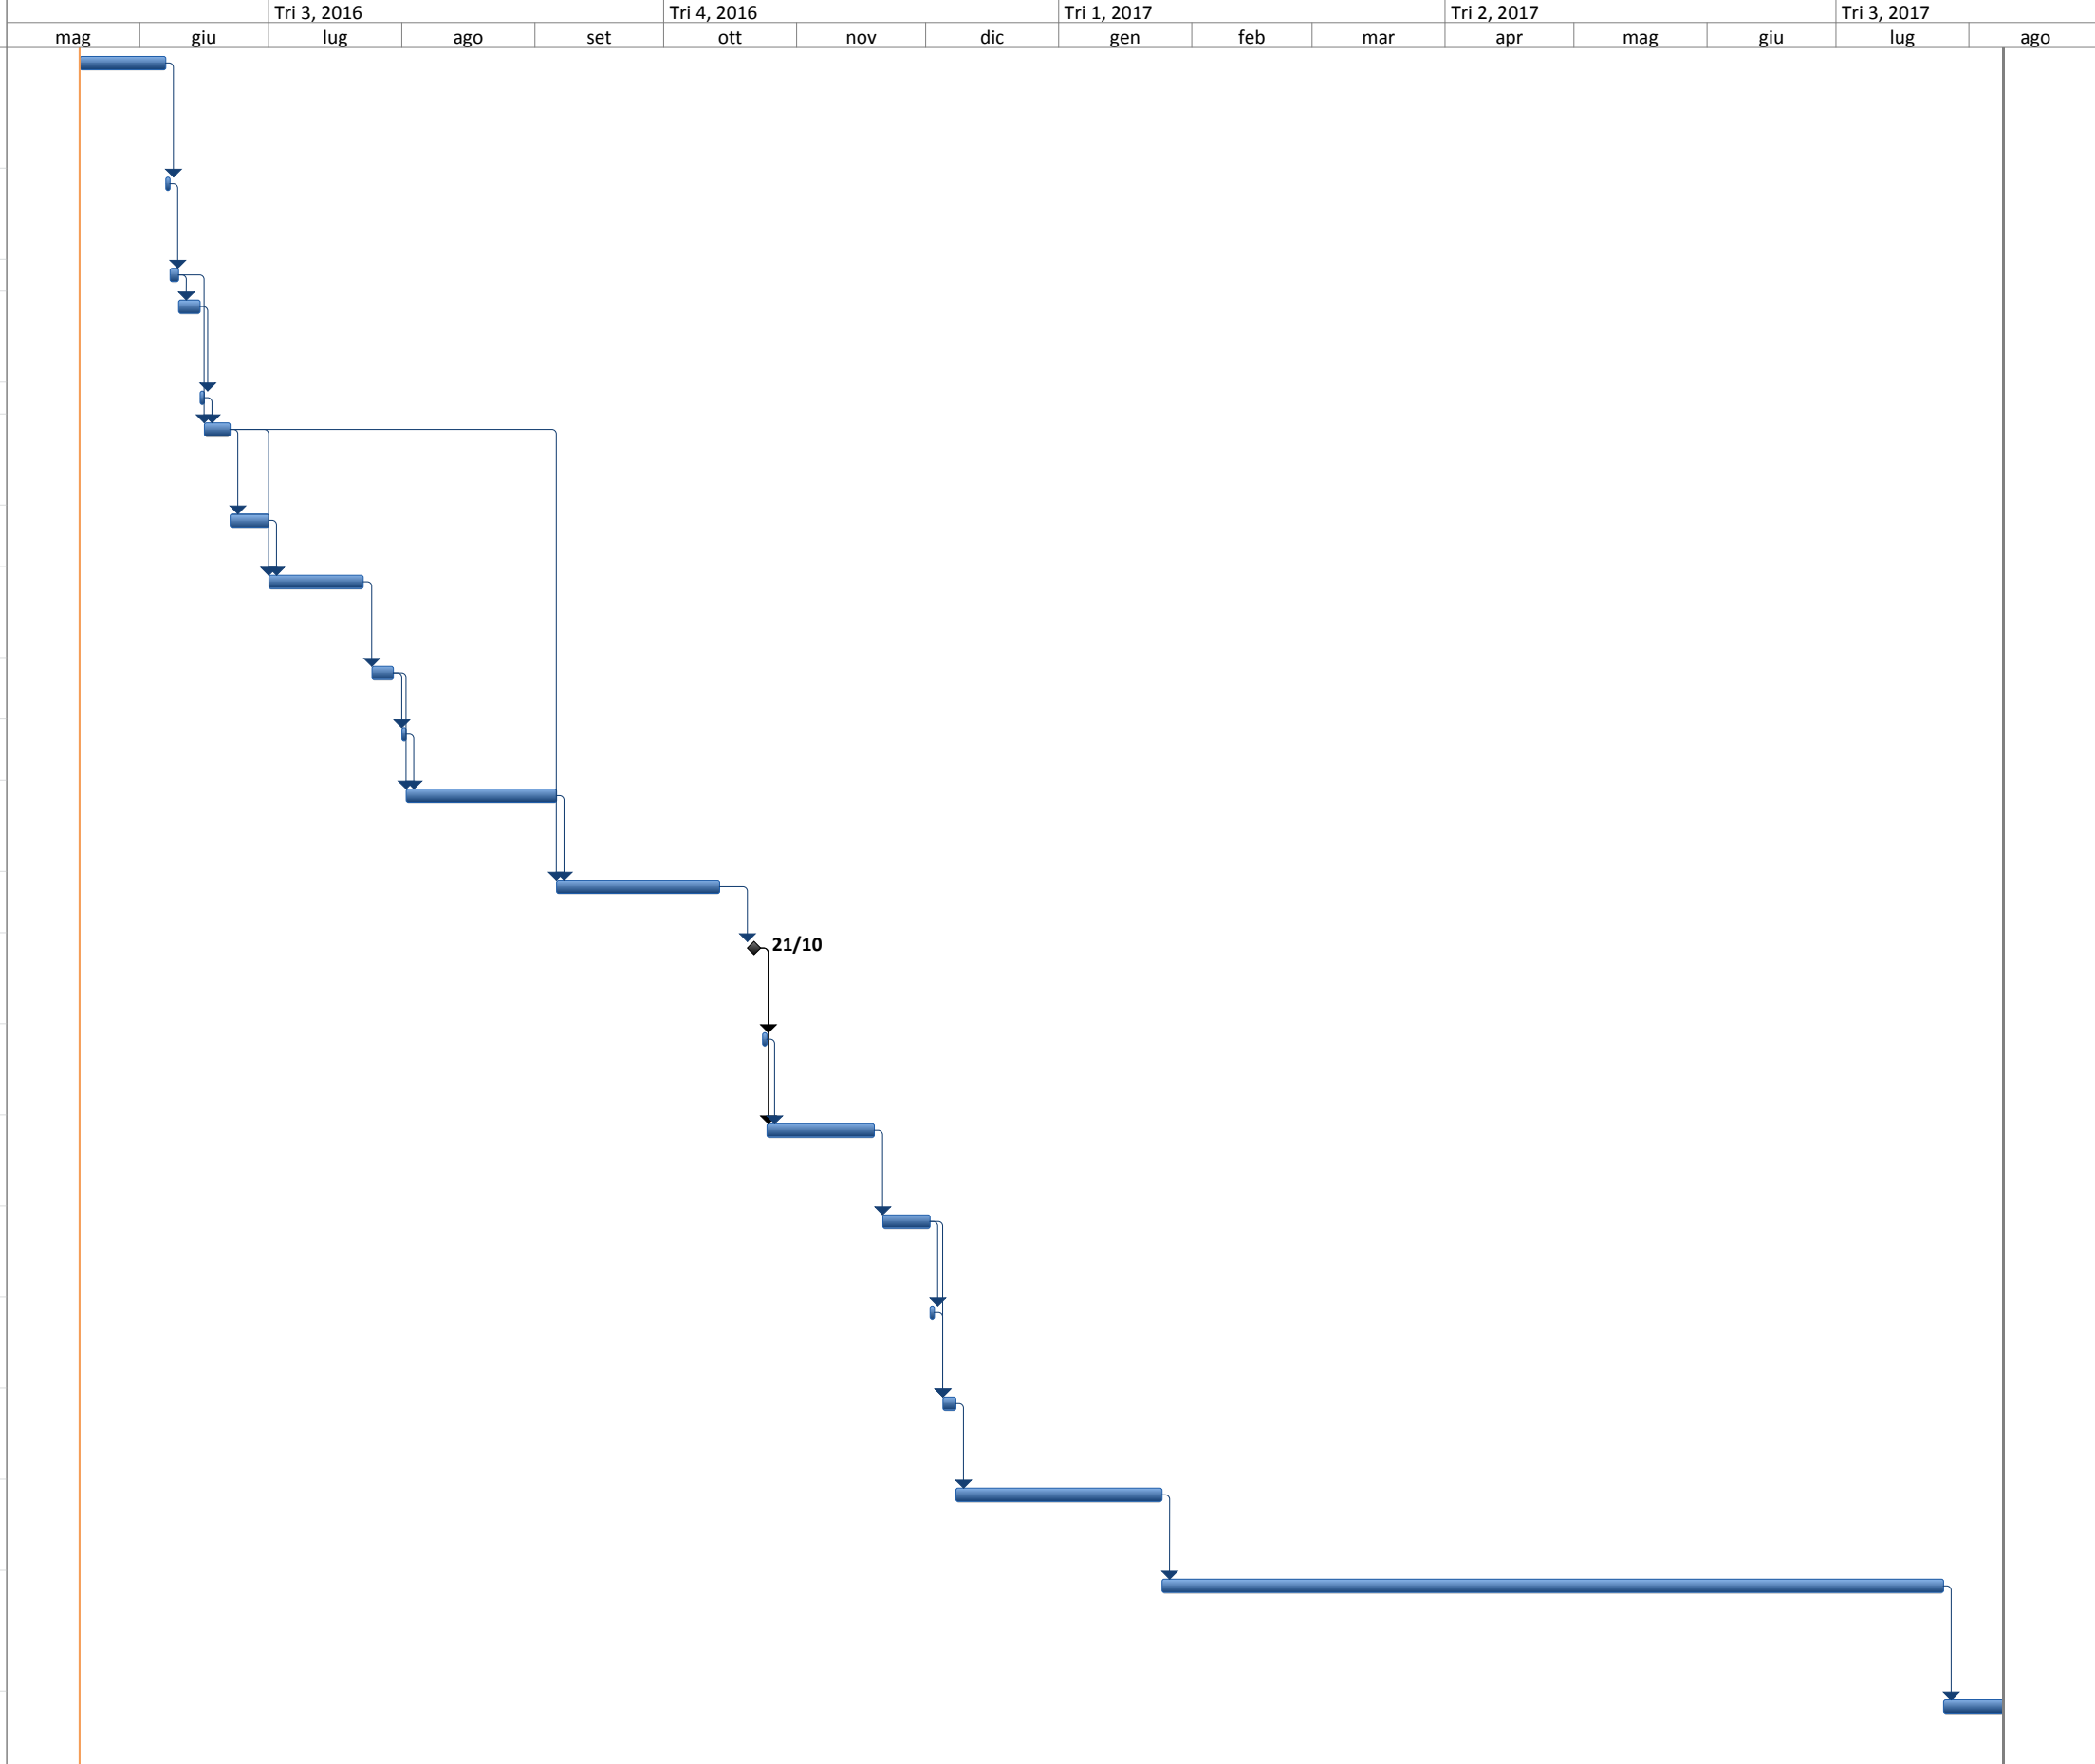






















ID		Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Tri 3, 2016					Tri 4, 2016			Tri 1, 2017			Tri 2, 2017			Tri 3, 2017			
						mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago		
1		Pubblicazione Avviso su GUUE, GURI, Servizio CCPPP MIT, INAF, Albo ORA	14 g	mer 18/05/16	lun 06/06/16																		
2		Trasmissione eventuale documentazione integrativa ai candidati	1 g	mar 07/06/16	mar 07/06/16																		
3		<b>Technical Meeting</b> ™	2 g	mer 08/06/16	gio 09/06/16																		
4		brainstorming aziende	3 g	ven 10/06/16	mar 14/06/16																		
5		<b>seduta finale TM</b>	1 g	mer 15/06/16	mer 15/06/16																		
6		Revisione finale doc	4 g	gio 16/06/16	mar 21/06/16																		
7		Approvazione finale CDA	7 g	mer 22/06/16	gio 30/06/16																		
8		Fase invito	16 g	ven 01/07/16	ven 22/07/16																		
9		Lavori commissione di gara	5 g	lun 25/07/16	ven 29/07/16																		
10		Aggiudicazione provvisoria	1 g	lun 01/08/16	lun 01/08/16																		
11		AVCPASS	25 g	mar 02/08/16	lun 05/09/16																		
12		Aggiudicazione definitiva / ssp	28 g	mar 06/09/16	gio 13/10/16																		
13		stipulazione contratto	6 g	ven 14/10/16	ven 21/10/16																		
14		KOM1 - RUP	1 g	lun 24/10/16	lun 24/10/16																		
15		progettazione esecutiva	19 g	mar 25/10/16	ven 18/11/16																		
16		verifica e validazione	9 g	lun 21/11/16	gio 01/12/16																		
17		Acquisizione progexe	1 g	ven 02/12/16	ven 02/12/16																		
18		KOM2 - GreenLightAct	3 g	lun 05/12/16	mer 07/12/16																		
19		Preparazione parti da sostituire / subcontractors / ...	34 g	gio 08/12/16	mar 24/01/17																		
20		Cantierizzazione - Esecuzione lavori: include allineamento + painting	130 g	mer 25/01/17	mar 25/07/17																		
21		COLLAUDO INAF	10 g	mer 26/07/17	mar 08/08/17																		

Progetto: GANTT Attuatori r04 17 Data: mer 18/05/16	Attività		Riepilogo		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo-fine	
	Divisione		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Scadenza	
	Cardine		Attività esterne		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Avanzamento	

Pagina 1
